

Projekt „Eesti Saun Ukrainasse“ aruanne

13.märts 2023

Projekt teostati MTÜ Slava Ukraini, Kaitsealiidu ja OÜ HUUM koostöös. *Pro bono* tööd tegid ka mitmed teised eraettevõtted. Projekti läbiviimiseks loodi MTÜ Slava Ukraini juurde eraldi pangakonto, kust teostati tehinguid ainult antud projekti raames. Enamus projekti teostajatest olid kaitsealiitlased ja OÜ HUUM planeeris kompleksi tehnilise kontseptsiooni *pro bono*.

MTÜ Slava Ukraini kontole „Eesti saun Ukrainasse“ laekus ajavahemikul 03.11-31.12.2022 sponsoritelt kokku **39 755 eurot**. Sponsoreid oli 18 sh 11 eraisikut, kellelt laekus 7 755 eurot ja 7 äriühingut, kellelt laekus 32 000 eurot. Suurim eraisiku annetus oli 5 000 eurot ja äriühingu annetus 10 000 eurot.

Projekti esialgseks eelarveks oli prognoositud **37,7 tuh eurot**, tegelikud kulud **14,6 tuh eurot**. Kokkuhoid saavutati eelkõige Eesti Kaitseväge annetatud veoautode ja pesumaja konteineri abil. Kokku hoitud raha kanti üle järgmise saunakomplekti eelarvesse.


Puhkeala:

Puhkeala eelarveks oli prognoositud 8,6 tuh eurot, tegelikud kulud 2,6 tuh eurot.

Suuremaks kuluks oli 2 Pop-up telki (1,8 tuh eurot), lisaks soetati led-projektoreid, laadimisjaamad, pikendusjuhtmeid, kandelampe ja tarvikuid.

Saun:

Sauna eelarveks oli planeeritud 2,25 tuh eurot, kuna kõik vajalikud tööd saadi sponsorluse korras, siis soetati ainult saunalinu 732 euro eest.

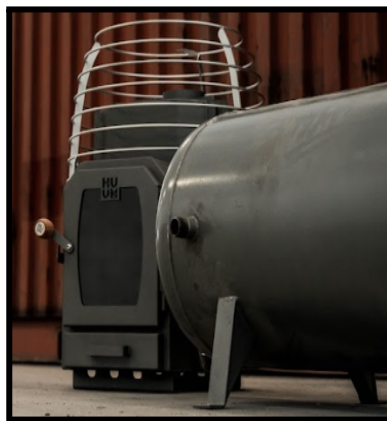

Pesumaja:

Pesumaja eelarveks oli planeeritud 541 eurot, kulud 673 eurot (võrkkotid)



Toetussüsteem:

Toetussüsteemi eelarveks oli planeeritud 2,98 tuh eurot, kuludeks kujunesid veepaagi soojendid summas 779 eurot.



Transport:

Transpordiga seotud kuludeks oli prognoositud 14,1 tuh eurot, kuludeks kujunesid varurehvid summas 1,26 tuh eurot.



Sõidud Ukrainasse:

Sauna ja pesumaja kohale viimiseks ja kontrollsõitudeks oli planeeritud 3,5 tuh eurot. Kulutused kokku 8,57 tuh eurot: kütus, teemaksud, autode transiidinumbrid, lennupiletid, rongipiletid, majutused.

Transpordi ülekulu oli eelkõige seotud ühe auto katkiminekuga detsembris 2022, mille tõttu see auto sõitis tagasi. Seda remonditi ja seejärel viidi Ukrainasse eraldi 13. veebruaril 2023. Teine osa ülekulust oli seotud vale planeerimisega, mis ei arvestanud nn. tagasiside ja kontrollsõidu kulusid.

Kommunikatsiooniks ja reserviks planeeritud 5,7 tuh eurot jäi kasutamata.

Saunakompleksi üleandmine.

Kompleksi üleandmisest on olemas Ukraina armee xxx väeosa kinnitusega üleandmiseakt.



Esimeste konteinerite üleandmine 21.detsembril 2022.



Pesumaja konteineri üleandmine 12 veebruar 2023



Saunast on Ukrainas on pilt ka Postimehe ajakirjaniku Vahur Laiapea artikli vahendusel. Pilt on tehtud paar päeva enne pesumaja konteineri päralejõudmist.

Lisa 1

| Projekti "Eesti Saun 1 Ukrainasse" eelarve ja täitmine | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. PUHKEALA | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Pop-up telk 3x6m | 1,390.00 | 2 | 2,780.00 | 1,753.32 |
| Pingid | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| Puitpõrand, restid 1x1m | 1,382.00 | 1 | 1,382.00 | |
| Kandelambid | 13.90 | 5 | 69.50 | 69.50 |
| Kandelambi varupirnid | 2.50 | 5 | 12.50 | 12.50 |
| LED-prožektor | 29.90 | 4 | 119.60 | 119.60 |
| Pikendusjuhe 50m | 89.43 | 3 | 268.29 | 268.29 |
| Pikendusjuhe 50m | 81.90 | 1 | 81.90 | 81.90 |
| Pikendusjuhe 5m | 12.58 | 2 | 25.16 | 25.16 |
| Kast valgustuse jms ladustamiseks | 65.99 | 1 | 65.99 | 65.99 |
| Pisitarvikuid | 8.61 | 1 | 8.61 | 8.61 |
| Maskeerimisvõrk (m2) | 6.00 | 360 | 2,160.00 | |
| Koormakate 8x12m | 53.00 | 4 | 212.00 | |
| Telgi soojustus (soojapuhur) | 579.00 | 2 | 1,158.00 | |
| Kuumaõhuvoolik | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| Laadimisjaam | 77.00 | 2 | 154 | 144.30 |
| | | PUHKEALA KOKKU | 8,597.55 | 2,549.17 |

| 2. SAUN | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
|--------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Soojak/konteiner | 6,000.00 | 1 | 0.00 | |
| Dushid | 300.00 | 2 | 0.00 | |
| Soojaku soojustus | 9.40 | 70 | 658.00 | |
| Keris | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| Veepaak | 400.00 | 1 | 0.00 | |
| Torutööd | 500.00 | 1 | 500.00 | |
| Valgustus | 500.00 | 1 | 500.00 | |
| Karkassi puit | 300.00 | 1 | 0.00 | |
| Siseviimistlustööd | 1,200.00 | 1 | 0.00 | |
| Siseviimistlus | 20.00 | 83 | 0.00 | |
| Põrandakate | 10.00 | 17.36 | 0.00 | |
| Saunalinad | 5.95 | 100 | 595.00 | 732.00 |
| Lava | 500.00 | 1 | 0.00 | |
| | | SAUN KOKKU | 2,253.00 | 732.00 |
| 3. PESUMAJA | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Konteiner | | 1 | 0.00 | |
| Pesumasin | 1,200.00 | 4 | 0.00 | |
| Kuivatusmasin | 1,200.00 | 4 | 0.00 | |
| Võrkpott (pesu) | 10.63 | 30 | 318.90 | 673.13 |
| Pesupulber 1 nädal | 73.95 | 3 | 221.85 | |
| Parandustööd | | | 0.00 | |
| | | PESUMAJA KOKKU | 540.75 | 673.13 |
| 4. TOETUSSÜSTEEM | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Generaator min 2kW | 449.00 | 2 | 898.00 | |
| Generaator | 14,000.00 | 1 | 0.00 | |
| Veepaak | 50.00 | 10 | 500.00 | |
| Veepump | 150.00 | 2 | 300.00 | |
| Veepaagi soojendid | 778.90 | 1 | 778.90 | 778.90 |
| Torustike süsteem | 500.00 | 1 | 500.00 | |
| Kaabeldus | 500.00 | | 0.00 | |
| | | TOETUSSÜSTEEM KOKKU | 2,976.90 | 778.90 |

| 5. TRANSPORT | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Veoauto konteinerite veoks | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| Toetusmasin | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| Diiselmootor | 1.96 | 3300 | 6,468.00 | |
| Tööriista komplekt | | komplekt | 0.00 | |
| Varurehv | 500.00 | 6 | 3,000.00 | 1,260.00 |
| Autojuhitud tasu | 150 | 15 | 2,250.00 | |
| Autojuhitud ööbimine | 70 | 9 | 630.00 | |
| Teemaksud | | | | |
| Hooldus remondikulu | 600 | 3 | 1,800.00 | |
| | | TRANSPORT KOKKU | 14,148.00 | 1,260.00 |
| 6. KOMMUNIKATSIOON | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Kleebised, embleemid | | | 1,000.00 | |
| 7. HALDUS | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Sõit Ukrainasse | 700.00 | 5 | 3,500.00 | 8,569.59 |
| 8. RESERV | Ühiku hind | Kogus | Hind (KM-g) kokku | E/a täitmine |
| Reserv | | | 4,726.06 | |
| | | | | |
| | | KOKKU | 37,742.26 | 14,562.79 |
